

ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 8.7


Nordplan AS

Ole Christian Børsum

12.02.2025

(13:55)

230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

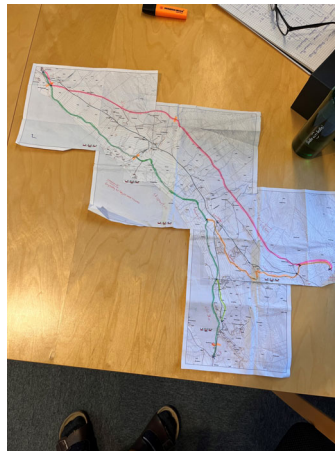

01	Felleskostnader	2 937 804
02	Bygning	
03	VVS-installasjoner	
04	Elkraft	
05	Tele og automatisering	
06	Andre installasjoner	
07	Utendørs	8 320 857
08	Generelle kostnader	2 841 189
09	Spesielle kostnader	481 745
10	Mva	
11	Forventet tillegg	437 448
12	Usikkerhetsavsetning	1 166 528
13	Prisregulering	446 817

Kalkyle

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel
01	Felleskostnader	2 937 804	28,0	26,1%
02	Bygning	0	0,0	0,0%
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%
04	Elkraft	0	0,0	0,0%
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%
	SUM 01-06 HUSKOSTNAD	2 937 804	28,0	26,1%
07	Utendørs	8 320 857	79,3	73,9%
	SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	11 258 662	107,3	100,0%
08	Generelle kostnader	2 841 189	27,1	25,2%
	SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	14 099 851	134,4	125,2%
09	Spesielle kostnader	481 745	4,6	4,3%
10	Mva	0	0,0	0,0%
	SUM 01-10 BASISKOSTNAD	14 581 595	139,0	129,5%
11	Forventet tillegg	437 448	4,2	3,9%
	SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	15 019 043	143,2	133,4%
12	Usikkerhetsavsetning	1 166 528	11,1	10,4%
	SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	16 185 571	154,3	143,8%
13	Prisregulering	446 817	4,3	4,0%
	SUM Kalkyle	16 632 387	158,6	147,7%

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	Utvendig mark	104 897	m ²

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold	Pris	Pris/m ²	m ² UMA	Side
 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø	16 632 387	158,6	104 896,77	003
Delprosjekter (#5) :				
 Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé	9 143 791	244,9	37 332,32	006
 Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasè	6 567 930	266,3	24 667,72	009
 Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	231 269	13,9	16 681,52	012
 Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	507 666	46,0	11 024,93	015
 Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	181 732	12,0	15 190,29	018
 Kalkyle(Elementer)				021


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 95 PRIS : 16 632 387 UMA : 104 896,77 PRIS/UMA : 158,6

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	 Utvendig mark	104 897	m ²

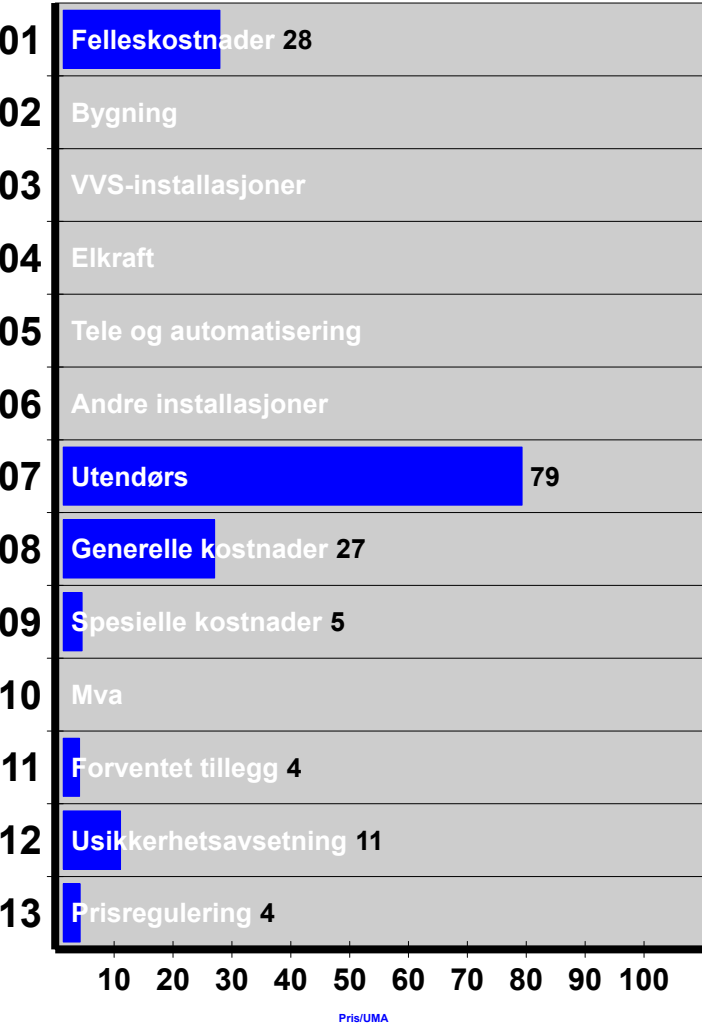

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	 Felleskostnader	2 937 804	28,0	26,1%	25	021
02	 Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	 VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	 Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	 Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	 Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	 SUM 01-06 HUSKOSTNAD	2 937 804	28,0	26,1%	25	
07	 Utendørs	8 320 857	79,3	73,9%	25	025
	 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	11 258 662	107,3	100,0%	50	
08	 Generelle kostnader	2 841 189	27,1	25,2%	20	027
	 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	14 099 851	134,4	125,2%	70	
09	 Spesielle kostnader	481 745	4,6	4,3%	5	028
10	 Mva	0	0,0	0,0%	0	
	 SUM 01-10 BASISKOSTNAD	14 581 595	139,0	129,5%	75	
11	 Forventet tillegg	437 448	4,2	3,9%	5	029
	 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	15 019 043	143,2	133,4%	80	
12	 Usikkerhetsavsetning	1 166 528	11,1	10,4%	5	030
	 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	16 185 571	154,3	143,8%	85	
13	 Prisregulering	446 817	4,3	4,0%	10	031
	 SUM Kalkyle	16 632 387	158,6	147,7%	95	



Skiløype i normal standard, uten flombelysning.

NB: For LCC-kalkyle vil bruksintensitet og andel dugnadsinnsats ha stort påvirkning på driftskostnadene.

MVA er ikke inkludert i kalkylen

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 95 PRIS : 16 632 387 UMA : 104 896,77 PRIS/UMA : 158,6

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	1 070 808	10,2	9,5%	5	021
01.2	Drift av byggeplass	753 928	7,2	6,7%	5	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	568 680	5,4	5,1%	5	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	269 800	2,6	2,4%	5	021
01.6	Kapitalytelser	274 588	2,6	2,4%	5	021
	SUM Felleskostnader	2 937 804	28,0	26,1%	25	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	1 521 841	14,5	13,5%	6	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	6 270 000	59,8	55,7%	4	025
07.3	Utendørs røranlegg	529 016	5,0	4,7%	15	025
	SUM Utendørs	8 320 857	79,3	73,9%	25	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	2 000 570	19,1	17,8%	5	027
08.3	Administrasjon	671 739	6,4	6,0%	5	027
08.4	Bikostnader	112 587	1,1	1,0%	5	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	56 293	0,5	0,5%	5	027
	SUM Generelle kostnader	2 841 189	27,1	25,2%	20	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	481 745	4,6	4,3%	5	028
	SUM Spesielle kostnader	481 745	4,6	4,3%	5	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
	SUM Forventet tillegg	437 448	4,2	3,9%	5	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
	SUM Usikkerhetsavsetning	1 166 528	11,1	10,4%	5	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	225 286	2,1	2,0%	5	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	221 531	2,1	2,0%	5	031
	SUM Prisregulering	446 817	4,3	4,0%	10	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

TOTALT 5 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 95 PRIS : 16 632 387 UMA : 104 896,77 PRIS/UMA : 158,6

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	2 937 804	28,0
31	Rørleggerarbeid	268 022	2,6
72	Anleggsarbeid på tomt	8 052 835	76,8
82	Prosjektering	2 000 570	19,1
83	Administrasjon	671 739	6,4
84	Bikostnader	112 587	1,1
85	Forsikringer, gebyrer	56 293	0,5
93	Finansieringskostnader	481 745	4,6
F1	Forventet tillegg	437 448	4,2
P1	Prisstigning	446 817	4,3
U1	Usikkerhetsavsetning	1 166 528	11,1
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	16 632 387	158,6


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 21 PRIS : 9 143 791 UMA : 37 332,32 PRIS/UMA : 244,9

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	37 332	m ²

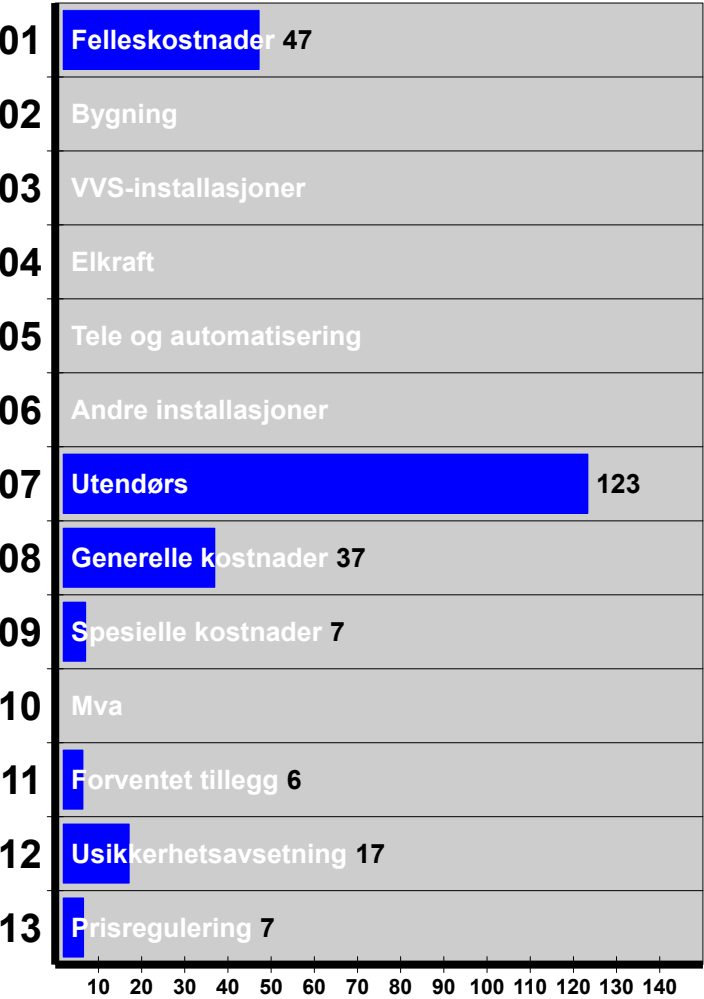

Pris/UMA - Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	1 764 249	47,3	27,7%	5	021
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	1 764 249	47,3	27,7%	5	
07	Utendørs	4 606 393	123,4	72,3%	7	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	6 370 642	170,6	100,0%	12	
08	Generelle kostnader	1 380 866	37,0	21,7%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	7 751 508	207,6	121,7%	16	
09	Spesielle kostnader	264 843	7,1	4,2%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	8 016 351	214,7	125,8%	17	
11	Forventet tillegg	240 491	6,4	3,8%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	8 256 842	221,2	129,6%	18	
12	Usikkerhetsavsetning	641 308	17,2	10,1%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	8 898 150	238,3	139,7%	19	
13	Prisregulering	245 641	6,6	3,9%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	9 143 791	244,9	143,5%	21	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 21 PRIS : 9 143 791 UMA : 37 332,32 PRIS/UMA : 244,9

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	690 959	18,5	10,8%	1	021
01.2	Drift av byggeplass	460 639	12,3	7,2%	1	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	345 479	9,3	5,4%	1	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	115 160	3,1	1,8%	1	021
01.6	Kapitalytelser	152 011	4,1	2,4%	1	021
Σ	SUM Felleskostnader	1 764 249	47,3	27,7%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	997 739	26,7	15,7%	2	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	3 306 000	88,6	51,9%	2	025
07.3	Utendørs røranlegg	302 655	8,1	4,8%	3	025
Σ	SUM Utendørs	4 606 393	123,4	72,3%	7	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	973 824	26,1	15,3%	1	027
08.3	Administrasjon	311 483	8,3	4,9%	1	027
08.4	Bikostnader	63 706	1,7	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	31 853	0,9	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	1 380 866	37,0	21,7%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	264 843	7,1	4,2%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	264 843	7,1	4,2%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	240 491	6,4	3,8%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	641 308	17,2	10,1%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	123 853	3,3	1,9%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	121 788	3,3	1,9%	1	031
Σ	SUM Prisregulering	245 641	6,6	3,9%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé

ELEMENTER : 21 PRIS : 9 143 791 UMA : 37 332,32 PRIS/UMA : 244,9

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	1 764 249	47,3
31	Rørleggerarbeid	150 408	4,0
72	Anleggsarbeid på tomt	4 455 985	119,4
82	Prosjektering	973 824	26,1
83	Administrasjon	311 483	8,3
84	Bikostnader	63 706	1,7
85	Forsikringer, gebyrer	31 853	0,9
93	Finansieringskostnader	264 843	7,1
F1	Forventet tillegg	240 491	6,4
P1	Prisstigning	245 641	6,6
U1	Usikkerhetsavsetning	641 308	17,2
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	9 143 791	244,9


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 6 567 930 UMA : 24 667,72 PRIS/UMA : 266,3

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	24 668	m ²

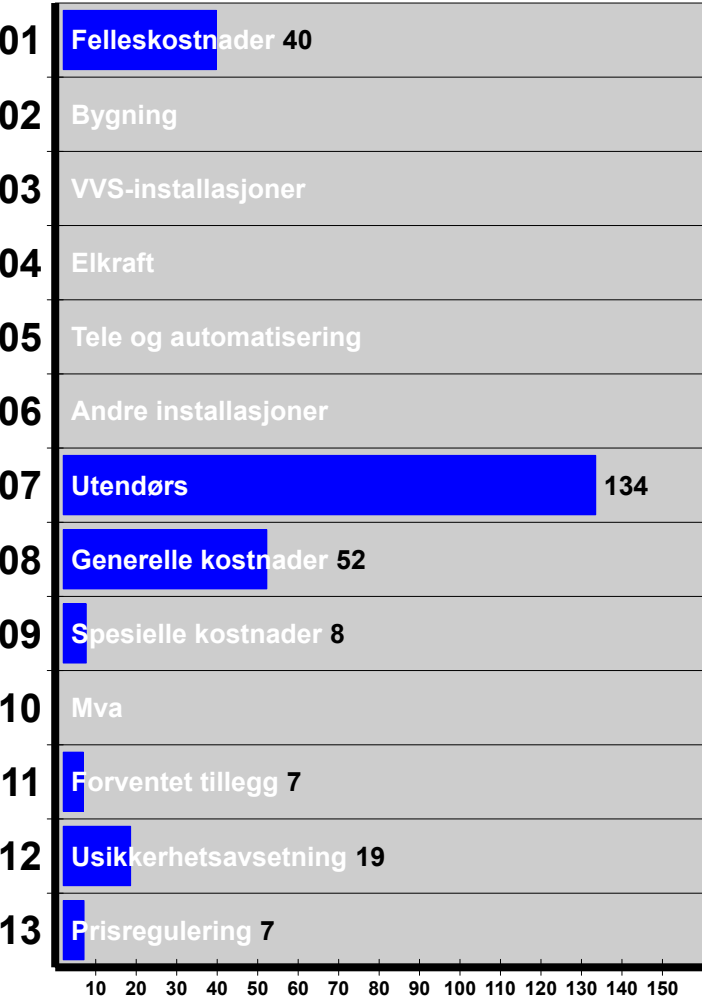

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	983 245	39,9	23,0%	5	021
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	983 245	39,9	23,0%	5	
07	Utendørs	3 294 351	133,5	77,0%	6	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	4 277 595	173,4	100,0%	11	
08	Generelle kostnader	1 290 267	52,3	30,2%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	5 567 862	225,7	130,2%	15	
09	Spesielle kostnader	190 235	7,7	4,4%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	5 758 097	233,4	134,6%	16	
11	Forventet tillegg	172 743	7,0	4,0%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	5 930 840	240,4	138,6%	17	
12	Usikkerhetsavsetning	460 648	18,7	10,8%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	6 391 488	259,1	149,4%	18	
13	Prisregulering	176 442	7,2	4,1%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	6 567 930	266,3	153,5%	20	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 6 567 930 UMA : 24 667,72 PRIS/UMA : 266,3

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	329 435	13,4	7,7%	1	021
01.2	Drift av byggeplass	247 076	10,0	5,8%	1	021
01.3	Byggeplassadministrasjon	181 189	7,3	4,2%	1	021
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	116 830	4,7	2,7%	1	022
01.6	Kapitalytelser	108 714	4,4	2,5%	1	022
Σ	SUM Felleskostnader	983 245	39,9	23,0%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	204 045	8,3	4,8%	1	025
07.2	Utendørs konstruksjoner	2 964 000	120,2	69,3%	2	025
07.3	Utendørs røranlegg	126 305	5,1	3,0%	3	025
Σ	SUM Utendørs	3 294 351	133,5	77,0%	6	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	973 824	39,5	22,8%	1	027
08.3	Administrasjon	252 279	10,2	5,9%	1	027
08.4	Bikostnader	42 776	1,7	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	21 388	0,9	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	1 290 267	52,3	30,2%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	190 235	7,7	4,4%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	190 235	7,7	4,4%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	172 743	7,0	4,0%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	460 648	18,7	10,8%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	88 963	3,6	2,1%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	87 480	3,5	2,0%	1	031
Σ	SUM Prisregulering	176 442	7,2	4,1%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé

ELEMENTER : 20 PRIS : 6 567 930 UMA : 24 667,72 PRIS/UMA : 266,3

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	983 245	39,9
31	Rørleggerarbeid	68 307	2,8
72	Anleggsarbeid på tomt	3 226 044	130,8
82	Prosjektering	973 824	39,5
83	Administrasjon	252 279	10,2
84	Bikostnader	42 776	1,7
85	Forsikringer, gebyrer	21 388	0,9
93	Finansieringskostnader	190 235	7,7
F1	Forventet tillegg	172 743	7,0
P1	Prisstigning	176 442	7,2
U1	Usikkerhetsavsetning	460 648	18,7
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	6 567 930	266,3

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 18 PRIS : 231 269 UMA : 16 681,52 PRIS/UMA : 13,9

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	16 682	m ²



Pris/UMA - Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	41 536	2,5	31,2%	5	022
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	41 536	2,5	31,2%	5	
07	Utendørs	91 692	5,5	68,8%	4	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	133 228	8,0	100,0%	9	
08	Generelle kostnader	62 826	3,8	47,2%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	196 054	11,8	147,2%	13	
09	Spesielle kostnader	6 699	0,4	5,0%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	202 753	12,2	152,2%	14	
11	Forventet tillegg	6 083	0,4	4,6%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	208 835	12,5	156,7%	15	
12	Usikkerhetsavsetning	16 220	1,0	12,2%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	225 056	13,5	168,9%	16	
13	Prisregulering	6 213	0,4	4,7%	2	031
	Σ SUM Kalkyle	231 269	13,9	173,6%	18	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 18 PRIS : 231 269 UMA : 16 681,52 PRIS/UMA : 13,9

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	11 003	0,7	8,3%	1	022
01.2	Drift av byggeplass	10 086	0,6	7,6%	1	022
01.3	Byggeplassadministrasjon	9 169	0,5	6,9%	1	022
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	8 252	0,5	6,2%	1	022
01.6	Kapitalytelser	3 026	0,2	2,3%	1	022
Σ	SUM Felleskostnader	41 536	2,5	31,2%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	78 109	4,7	58,6%	1	025
07.3	Utendørs røranlegg	13 583	0,8	10,2%	3	025
Σ	SUM Utendørs	91 692	5,5	68,8%	4	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	19 020	1,1	14,3%	1	027
08.3	Administrasjon	41 808	2,5	31,4%	1	027
08.4	Bikostnader	1 332	0,1	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	666	0,0	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	62 826	3,8	47,2%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	6 699	0,4	5,0%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	6 699	0,4	5,0%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	6 083	0,4	4,6%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	16 220	1,0	12,2%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	3 133	0,2	2,4%	1	031
13.2	Prisregulering i byggeperioden	3 080	0,2	2,3%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	6 213	0,4	4,7%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé

ELEMENTER : 18 PRIS : 231 269 UMA : 16 681,52 PRIS/UMA : 13,9

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	41 536	2,5
31	Rørleggerarbeid	6 333	0,4
72	Anleggsarbeid på tomt	85 359	5,1
82	Prosjektering	19 020	1,1
83	Administrasjon	41 808	2,5
84	Bikostnader	1 332	0,1
85	Forsikringer, gebyrer	666	0,0
93	Finansieringskostnader	6 699	0,4
F1	Forventet tillegg	6 083	0,4
P1	Prisstigning	6 213	0,4
U1	Usikkerhetsavsetning	16 220	1,0
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	231 269	13,9


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 507 666 UMA : 11 024,93 PRIS/UMA : 46,0

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	11 025	m ²

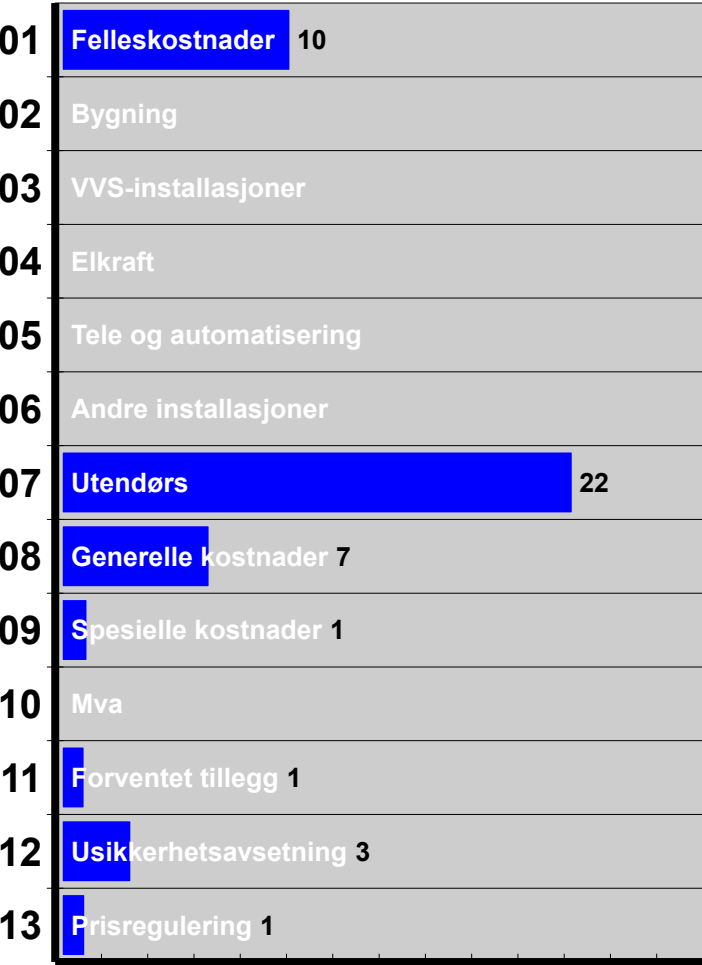

Pris/UMA - Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	111 428	10,1	31,2%	5	022
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	111 428	10,1	31,2%	5	
07	Utendørs	245 979	22,3	68,8%	4	025
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	357 407	32,4	100,0%	9	
08	Generelle kostnader	72 958	6,6	20,4%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	430 366	39,0	120,4%	13	
09	Spesielle kostnader	14 704	1,3	4,1%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	445 070	40,4	124,5%	14	
11	Forventet tillegg	13 352	1,2	3,7%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	458 422	41,6	128,3%	15	
12	Usikkerhetsavsetning	35 606	3,2	10,0%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	494 028	44,8	138,2%	16	
13	Prisregulering	13 638	1,2	3,8%	2	032
	Σ SUM Kalkyle	507 666	46,0	142,0%	18	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 507 666 UMA : 11 024,93 PRIS/UMA : 46,0

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	29 517	2,7	8,3%	1	022
01.2	Drift av byggeplass	27 058	2,5	7,6%	1	023
01.3	Byggeplassadministrasjon	24 598	2,2	6,9%	1	023
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	22 138	2,0	6,2%	1	023
01.6	Kapitalytelser	8 117	0,7	2,3%	1	023
Σ	SUM Felleskostnader	111 428	10,1	31,2%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	191 083	17,3	53,5%	1	025
07.3	Utendørs røranlegg	54 896	5,0	15,4%	3	025
Σ	SUM Utendørs	245 979	22,3	68,8%	4	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	24 464	2,2	6,8%	1	027
08.3	Administrasjon	43 133	3,9	12,1%	1	027
08.4	Bikostnader	3 574	0,3	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	1 787	0,2	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	72 958	6,6	20,4%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	14 704	1,3	4,1%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	14 704	1,3	4,1%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	13 352	1,2	3,7%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	35 606	3,2	10,0%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	6 876	0,6	1,9%	1	032
13.2	Prisregulering i byggeperioden	6 762	0,6	1,9%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	13 638	1,2	3,8%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 507 666 UMA : 11 024,93 PRIS/UMA : 46,0

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	111 428	10,1
31	Rørleggerarbeid	25 897	2,3
72	Anleggsarbeid på tomt	220 082	20,0
82	Prosjektering	24 464	2,2
83	Administrasjon	43 133	3,9
84	Bikostnader	3 574	0,3
85	Forsikringer, gebyrer	1 787	0,2
93	Finansieringskostnader	14 704	1,3
F1	Forventet tillegg	13 352	1,2
P1	Prisstigning	13 638	1,2
U1	Usikkerhetsavsetning	35 606	3,2
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	507 666	46,0


PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 181 732 UMA : 15 190,29 PRIS/UMA : 12,0

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
UMA	✚ Utvendig mark	15 190	m ²

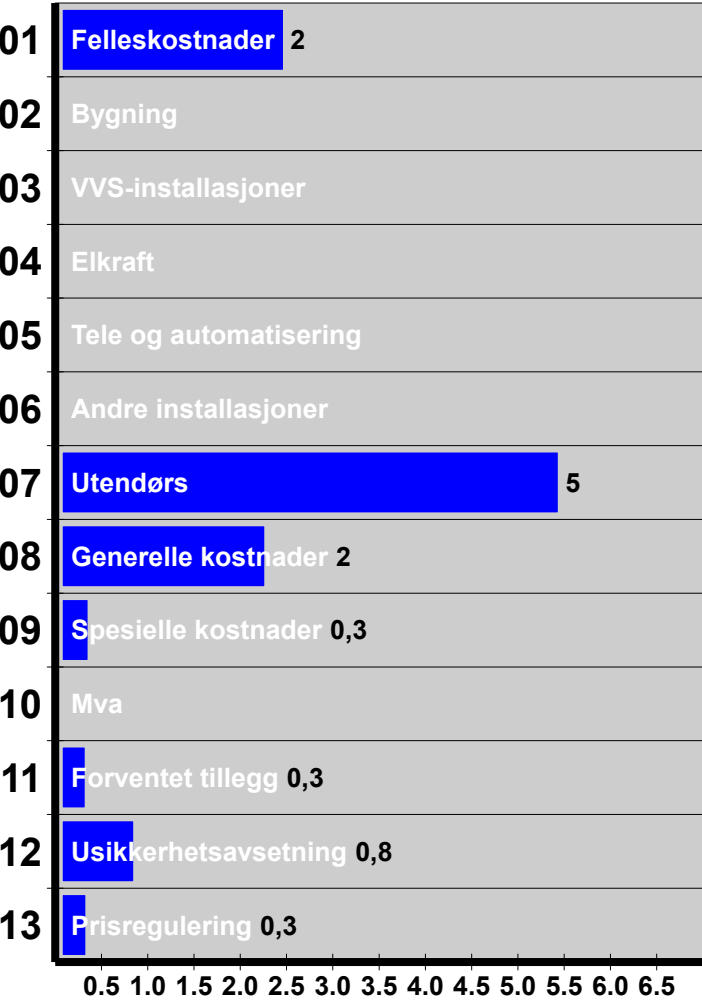

Pris/UMA - Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

#	Konto	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	37 346	2,5	31,2%	5	023
02	Bygning	0	0,0	0,0%	0	
03	VVS-installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
04	Elkraft	0	0,0	0,0%	0	
05	Tele og automatisering	0	0,0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	37 346	2,5	31,2%	5	
07	Utendørs	82 442	5,4	68,8%	4	026
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	119 789	7,9	100,0%	9	
08	Generelle kostnader	34 272	2,3	28,6%	4	027
	Σ SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	154 060	10,1	128,6%	13	
09	Spesielle kostnader	5 264	0,3	4,4%	1	028
10	Mva	0	0,0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	159 324	10,5	133,0%	14	
11	Forventet tillegg	4 780	0,3	4,0%	1	029
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	164 104	10,8	137,0%	15	
12	Usikkerhetsavsetning	12 746	0,8	10,6%	1	030
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	176 850	11,6	147,6%	16	
13	Prisregulering	4 882	0,3	4,1%	2	032
	Σ SUM Kalkyle	181 732	12,0	151,7%	18	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 181 732 UMA : 15 190,29 PRIS/UMA : 12,0

01	Felleskostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
01.1	Tilrigging og nedrigging av byggeplass	9 893	0,7	8,3%	1	023
01.2	Drift av byggeplass	9 069	0,6	7,6%	1	023
01.3	Byggeplassadministrasjon	8 244	0,5	6,9%	1	023
01.4	Prosjektering, kontroll og dokumentasjon	7 420	0,5	6,2%	1	023
01.6	Kapitalytelser	2 721	0,2	2,3%	1	024
Σ	SUM Felleskostnader	37 346	2,5	31,2%	5	
07	Utendørs	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
07.1	Bearbeidet terreng	50 866	3,3	42,5%	1	026
07.3	Utendørs røranlegg	31 576	2,1	26,4%	3	026
Σ	SUM Utendørs	82 442	5,4	68,8%	4	
08	Generelle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
08.2	Prosjektering	9 438	0,6	7,9%	1	027
08.3	Administrasjon	23 037	1,5	19,2%	1	027
08.4	Bikostnader	1 198	0,1	1,0%	1	027
08.5	Forsikringer, gebyrer, o.l.	599	0,0	0,5%	1	027
Σ	SUM Generelle kostnader	34 272	2,3	28,6%	4	
09	Spesielle kostnader	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
09.3	Finansiering	5 264	0,3	4,4%	1	028
Σ	SUM Spesielle kostnader	5 264	0,3	4,4%	1	
11	Forventet tillegg	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Forventet tillegg	4 780	0,3	4,0%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
Σ	SUM Usikkerhetsavsetning	12 746	0,8	10,6%	1	
13	Prisregulering	Pris	Pris/UMA	Andel	Antall	Side
13.1	Prisregulering frem til byggestart	2 462	0,2	2,1%	1	032
13.2	Prisregulering i byggeperioden	2 421	0,2	2,0%	1	032
Σ	SUM Prisregulering	4 882	0,3	4,1%	2	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø

Nordplan AS

DELPROSJEKT : Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen

ELEMENTER : 18 PRIS : 181 732 UMA : 15 190,29 PRIS/UMA : 12,0

Fag	Navn	Pris	Pris/UMA
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	37 346	2,5
31	Rørleggerarbeid	17 077	1,1
72	Anleggsarbeid på tomt	65 366	4,3
82	Prosjektering	9 438	0,6
83	Administrasjon	23 037	1,5
84	Bikostnader	1 198	0,1
85	Forsikringer, gebyrer	599	0,0
93	Finansieringskostnader	5 264	0,3
F1	Forventet tillegg	4 780	0,3
P1	Prisstigning	4 882	0,3
U1	Usikkerhetsavsetning	12 746	0,8
*	Øvrige LCC aktiviteter	0	0,0
	SUM	181 732	12,0

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader			ELEMENTER : 25		PRIS : 2 937 804		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 28,0		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA	
 01		Felleskostnader				25 elementer					
 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				5 elementer			37 332,32		
 01.1.(	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Rigging komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	4 606 393,29	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett rigging basert på %		0,15	690 959	37 332,32	18,5	
 01.2.(	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Drift komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	4 606 393,29	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett drift basert på %		0,10	460 639	37 332,32	12,3	
 01.3.(	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	4 606 393,29	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett byggeplassadministrasjon basert på %		0,07	345 479	37 332,32	9,3	
 01.4.(	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:</i>	4 606 393,29	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette ytelser basert på %		0,03	115 160	37 332,32	3,1	
 01.6.(	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Kapitalytelser <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:</i>	4 606 393,29	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette kapitalytelser basert på %		0,03	152 011	37 332,32	4,1	
	SUM 01	Felleskostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé						1 764 249	37 332,32	47,3	
 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				5 elementer			24 667,72		
 01.1.(	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Rigging komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	3 294 350,56	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett rigging basert på %		0,10	329 435	24 667,72	13,4	
 01.2.(	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Drift komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	3 294 350,56	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett drift basert på %		0,07	247 076	24 667,72	10,0	
 01.3.(	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	3 294 350,56	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplett byggeplassadministrasjon basert på %		0,06	181 189	24 667,72	7,3	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader					ELEMENTER : 25		PRIS : 2 937 804		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 28,0
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
01.4.i	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:	3 294 350,56	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette ytelser basert på %	0,04	116 830	24 667,72	4,7		
01.6.i	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Kapitalytelser Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:	3 294 350,56	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette kapitalytelser basert på %	0,03	108 714	24 667,72	4,4		
SUM 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé					983 245	24 667,72	39,9		
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé	5 elementer						16 681,52		
01.1.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Rigging komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	91 691,97	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette rigging basert på %	0,12	11 003	16 681,52	0,7		
01.2.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Drift komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	91 691,97	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette drift basert på %	0,11	10 086	16 681,52	0,6		
01.3.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	91 691,97	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette byggeplassadministrasjon basert på %	0,10	9 169	16 681,52	0,5		
01.4.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:	91 691,97	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette ytelser basert på %	0,09	8 252	16 681,52	0,5		
01.6.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Kapitalytelser Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:	91 691,97	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette kapitalytelser basert på %	0,03	3 026	16 681,52	0,2		
SUM 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé					41 536	16 681,52	2,5		
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen	5 elementer						11 024,93		
01.1.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Rigging komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.	245 978,93	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette rigging basert på %	0,12	29 517	11 024,93	2,7		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 01 Felleskostnader			ELEMENTER : 25		PRIS : 2 937 804		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 28,0		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
01.2.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Drift komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	245 978,93	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette drift basert på %	0,11	27 058	11 024,93	2,5		
01.3.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	245 978,93	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette byggeplassadministrasjon basert på %	0,10	24 598	11 024,93	2,2		
01.4.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:</i>	245 978,93	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette ytelser basert på %	0,09	22 138	11 024,93	2,0		
01.6.1	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Kapitalytelser <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:</i>	245 978,93	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette kapitalytelser basert på %	0,03	8 117	11 024,93	0,7		
SUM 01		Felleskostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				111 428		11 024,93	10,1		
01		Felleskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	5 elementer					15 190,29			
01.1.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Rigging komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	82 442,38	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette rigging basert på %	0,12	9 893	15 190,29	0,7		
01.2.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Drift komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	82 442,38	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette drift basert på %	0,11	9 069	15 190,29	0,6		
01.3.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Byggeplassadministrasjon komplett <i>Prosentvis andel av entreprise Formel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K02 = summen av konto 02 Bygning, K03 = summen av konto 03 VVS osv.</i>	82 442,38	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette byggeplassadministrasjon basert på %	0,10	8 244	15 190,29	0,5		
01.4.1	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett <i>Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:</i>	82 442,38	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 <i>Mrk</i> Komplette ytelser basert på %	0,09	7 420	15 190,29	0,5		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø							Nordplan AS		
KONTO : 01 Felleskostnader			ELEMENTER : 25			PRIS : 2 937 804	UMA : 104 896,77	PRIS/UMA : 28,0	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA
01.6.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Kapitalytelser Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Pro:	82 442,38	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07 Mrk Komplette kapitalytelser basert på %	0,03	2 721	15 190,29	0,2
Σ	SUM 01	Felleskostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen					37 346	15 190,29	2,5
⊕	SUM 01	Felleskostnader					2 937 804	104 896,77	28,0

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 07 Utendørs			ELEMENTER : 25		PRIS : 8 320 857		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 79,3		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA	
07		Utendørs				25 elementer					
07		Utendørs Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				7 elementer			37 332,32		
07.1.i	Skiløype - Trasé ABCD	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	28 223,23	m ²	76% av Utvendig mark (UMA)		16,86	475 707	37 332,32	12,7	
07.1.i	Skiløype - Trasé ABCD	Flytting og lagring av matjord	2 367,03	m ³			220,54	522 032	37 332,32	14,0	
07.2.i	Skiløype - Trasé ABCD	Brukonstruksjon, Grøtbekken Øvre	1,00	stk			1 881 000,00	1 881 000	37 332,32	50,4	
07.2.i	Skiløype - Trasé ABCD	Brukonstruksjon, Håmmårbekken	1,00	stk			1 425 000,00	1 425 000	37 332,32	38,2	
07.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Stikkrenner	126,00	m			1 193,71	150 408	37 332,32	4,0	
	Beskrivelse	21 stikkrenner7 Ø100014 Ø400									
07.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	126,00	m			1 016,65	128 098	37 332,32	3,4	
07.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	210,00	m ³			114,99	24 148	37 332,32	0,6	
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé						4 606 393	37 332,32	123,4	
07		Utendørs Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				6 elementer			24 667,72		
07.1.i	Skiløype - Trasé ABE -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	16 101,85	m ²	65% av Utvendig mark (UMA)		12,67	204 045	24 667,72	8,3	
07.2.i	Skiløype - Trasé ABE -	Brukonstruksjon, Grøtbekken Nedre	1,00	stk			1 539 000,00	1 539 000	24 667,72	62,4	
07.2.i	Skiløype - Trasé ABE -	Brukonstruksjon, Håmmårbekken	1,00	stk			1 425 000,00	1 425 000	24 667,72	57,8	
07.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Stikkrenner	48,00	m			1 423,06	68 307	24 667,72	2,8	
	Beskrivelse	8 stikkrenner4 Ø10004 Ø400									
07.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	48,00	m			1 016,65	48 799	24 667,72	2,0	
07.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	80,00	m ³			114,99	9 199	24 667,72	0,4	
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé						3 294 351	24 667,72	133,5	
07		Utendørs Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				4 elementer			16 681,52		
07.1.i	Skiløype - Trasé ECD -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	6 163,82	m ²	37% av Utvendig mark (UMA)		12,67	78 109	16 681,52	4,7	
07.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Stikkrenner	6,00	m			1 055,54	6 333	16 681,52	0,4	
	Beskrivelse	2 stikkrenner1 Ø10001 Ø400									
07.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	6,00	m			1 016,65	6 100	16 681,52	0,4	
07.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	10,00	m ³			114,99	1 150	16 681,52	0,1	
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé						91 692	16 681,52	5,5	
07		Utendørs Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				4 elementer			11 024,93		
07.1.i	Skiløype - Trasé EFG -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	8 875,06	m ²	81% av Utvendig mark (UMA)		21,53	191 083	11 024,93	17,3	
07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Stikkrenner	24,00	m			1 079,04	25 897	11 024,93	2,3	
	Beskrivelse	4 stikkrenner1 Ø10003 Ø400									
07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	24,00	m			1 016,65	24 400	11 024,93	2,2	
07.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	40,00	m ³			114,99	4 600	11 024,93	0,4	
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen						245 979	11 024,93	22,3	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 07 Utendørs			ELEMENTER : 25		PRIS : 8 320 857		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 79,3		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
 07		Utendørs Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen	4 elementer					15 190,29			
 07.1.(	Skiløype - Trasé EFH -	Rydding av tomt - trær og vegetasjon	4 352,02	m ²	29% av Utvendig mark (UMA)	11,69	50 866	15 190,29	3,3		
 07.3.(	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Stikkrenner 2 stikkrenner1 Ø10001 Ø400	12,00	m		1 423,06	17 077	15 190,29	1,1		
 07.3.(	Skiløype - Trasé EFH -	Uavstivet grøft i løsmasser, dybde 1,0 - 1,5 m	12,00	m		1 016,65	12 200	15 190,29	0,8		
 07.3.(	Skiløype - Trasé EFH -	Uavstivet grøft, tilkobling til stikkrenne	20,00	m ³		114,99	2 300	15 190,29	0,2		
	SUM 07	Utendørs Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				82 442		15 190,29	5,4		
	SUM 07	Utendørs				8 320 857		104 896,77	79,3		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS		
KONTO : 08 Generelle kostnader					ELEMENTER : 20		PRIS : 2 841 189		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 27,1	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	20 elementer		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA	
08		Generelle kostnader				20 elementer						
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				4 elementer				37 332,32		
08.2.i	Skiløype - Trasé ABCD	Prosjektering alle fag	26 132,62	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			37,26	973 824	37 332,32	26,1	
08.3.i	Skiløype - Trasé ABCD	Administrasjon	11 199,70	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			27,81	311 483	37 332,32	8,3	
08.4.i	Skiløype - Trasé ABCD	Bikostnader utendørsarbeider	6 370 641,92	m ²	K01+K07			0,01	63 706	37 332,32	1,7	
08.5.i	Skiløype - Trasé ABCD	Forsikringer og gebyrer utendørs	6 370 641,92	m ²	K01+K07			0,0050	31 853	37 332,32	0,9	
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold										
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé							1 380 866	37 332,32	37,0	
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				4 elementer				24 667,72		
08.2.i	Skiløype - Trasé ABE -	Prosjektering alle fag	17 267,40	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			56,40	973 824	24 667,72	39,5	
08.3.i	Skiløype - Trasé ABE -	Administrasjon	7 400,32	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			34,09	252 279	24 667,72	10,2	
08.4.i	Skiløype - Trasé ABE -	Bikostnader utendørsarbeider	4 277 595,07	m ²	K01+K07			0,01	42 776	24 667,72	1,7	
08.5.i	Skiløype - Trasé ABE -	Forsikringer og gebyrer utendørs	4 277 595,07	m ²	K01+K07			0,0050	21 388	24 667,72	0,9	
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold										
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé							1 290 267	24 667,72	52,3	
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				4 elementer				16 681,52		
08.2.i	Skiløype - Trasé ECD -	Prosjektering alle fag	11 677,06	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			1,63	19 020	16 681,52	1,1	
08.3.i	Skiløype - Trasé ECD -	Administrasjon	5 004,46	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			8,35	41 808	16 681,52	2,5	
08.4.i	Skiløype - Trasé ECD -	Bikostnader utendørsarbeider	133 228,43	m ²	K01+K07			0,01	1 332	16 681,52	0,1	
08.5.i	Skiløype - Trasé ECD -	Forsikringer og gebyrer utendørs	133 228,43	m ²	K01+K07			0,0050	666	16 681,52	0,0	
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold										
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé							62 826	16 681,52	3,8	
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen				4 elementer				11 024,93		
08.2.i	Skiløype - Trasé EFG -	Prosjektering alle fag	7 717,45	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			3,17	24 464	11 024,93	2,2	
08.3.i	Skiløype - Trasé EFG -	Administrasjon	3 307,48	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			13,04	43 133	11 024,93	3,9	
08.4.i	Skiløype - Trasé EFG -	Bikostnader utendørsarbeider	357 407,38	m ²	K01+K07			0,01	3 574	11 024,93	0,3	
08.5.i	Skiløype - Trasé EFG -	Forsikringer og gebyrer utendørs	357 407,38	m ²	K01+K07			0,0050	1 787	11 024,93	0,2	
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold										
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen							72 958	11 024,93	6,6	
08		Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen				4 elementer				15 190,29		
08.2.i	Skiløype - Trasé EFH -	Prosjektering alle fag	10 633,20	m ²	70% av Utvendig mark (UMA)			0,89	9 438	15 190,29	0,6	
08.3.i	Skiløype - Trasé EFH -	Administrasjon	4 557,09	m ²	30% av Utvendig mark (UMA)			5,06	23 037	15 190,29	1,5	
08.4.i	Skiløype - Trasé EFH -	Bikostnader utendørsarbeider	119 788,78	m ²	K01+K07			0,01	1 198	15 190,29	0,1	
08.5.i	Skiløype - Trasé EFH -	Forsikringer og gebyrer utendørs	119 788,78	m ²	K01+K07			0,0050	599	15 190,29	0,0	
	Merknader	NB! Sjekk lokale forhold										
	SUM 08	Generelle kostnader Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen							34 272	15 190,29	2,3	
	SUM 08	Generelle kostnader							2 841 189	104 896,77	27,1	

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS			
KONTO : 09 Spesielle kostnader					ELEMENTER : 5		PRIS : 481 745		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 4,6		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA				
09		Spesielle kostnader			5 elementer								
09.3.(	Skiløype - Trasé ABCD	Finansieringskostnader	2 648 431,95	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	264 843	37 332,32	7,1				
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader								
09.3.(	Skiløype - Trasé ABE -	Finansieringskostnader	1 902 352,85	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	190 235	24 667,72	7,7				
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader								
09.3.(	Skiløype - Trasé ECD -	Finansieringskostnader	66 985,24	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	6 699	16 681,52	0,4				
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader								
09.3.(	Skiløype - Trasé EFG -	Finansieringskostnader	147 041,61	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	14 704	11 024,93	1,3				
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader								
09.3.(	Skiløype - Trasé EFH -	Finansieringskostnader	52 637,29	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_4+K09_5+K09_6	0,10	5 264	15 190,29	0,3				
	Beskrivelse	Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K		Mrk	Komplette avsetninger for finansieringskostnader								
	SUM 09	Spesielle kostnader				481 745	104 896,77	4,6					

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS		
KONTO : 11 Forventet tillegg					ELEMENTER : 5		PRIS : 437 448		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 4,2	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh		Pris	UMA	ris/UMA		
11		Forventet tillegg				5 elementer						
11.00	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Forventede tillegg (reserver) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	8 016 351,33	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %	0,03	240 491		37 332,32	6,4		
11.00	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Forventede tillegg (reserver) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	5 758 097,28	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %	0,03	172 743		24 667,72	7,0		
11.00	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Forventede tillegg (reserver) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	202 752,88	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %	0,03	6 083		16 681,52	0,4		
11.00	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Forventede tillegg (reserver) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	445 069,84	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %	0,03	13 352		11 024,93	1,2		
11.00	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Forventede tillegg (reserver) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	159 324,08	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %	0,03	4 780		15 190,29	0,3		
	SUM 11	Forventet tillegg					437 448		104 896,77	4,2		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS			
KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning					ELEMENTER : 5		PRIS : 1 166 528		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 11,1		
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	5 elementer		Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
 12		Usikkerhetsavsetning											
 12.00	Skiløype - Trasé ABCD Beskrivelse	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av projektkostnad</i> <i>Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	8 016 351,33	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> <i>Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %</i>			0,08	641 308	37 332,32	17,2		
 12.00	Skiløype - Trasé ABE - Beskrivelse	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av projektkostnad</i> <i>Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	5 758 097,28	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> <i>Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %</i>			0,08	460 648	24 667,72	18,7		
 12.00	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av projektkostnad</i> <i>Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	202 752,88	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> <i>Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %</i>			0,08	16 220	16 681,52	1,0		
 12.00	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av projektkostnad</i> <i>Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	445 069,84	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> <i>Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %</i>			0,08	35 606	11 024,93	3,2		
 12.00	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Usikkerhetsavsetning (marginer) <i>Prosentvis andel av projektkostnad</i> <i>Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10</i> <i>Prosentatsen reguleres i reseptmengden.</i> <i>K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.</i>	159 324,08	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 <i>Mrk</i> <i>Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %</i>			0,08	12 746	15 190,29	0,8		
	SUM 12	Usikkerhetsavsetning							1 166 528	104 896,77	11,1		

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS							
KONTO : 13 Prisregulering										ELEMENTER : 10		PRIS : 446 817		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 4,3	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh		Pris	UMA	ris/UMA							
 13		Prisregulering				10 elementer											
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé				2 elementer			37 332,32								
 13.1.(	Skiløype - Trasé ABCD	Prisendring frem til byggestart	4 128 420,94	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12'	0,03	123 853	37 332,32	3,3								
	Beskrivelse	Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												
 13.2.(	Skiløype - Trasé ABCD	Prisendring i byggeperioden	4 059 613,92	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0	0,03	121 788	37 332,32	3,3								
	Beskrivelse	Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %												
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ABCD - Øvre trasé						245 641	37 332,32	6,6							
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé				2 elementer			24 667,72								
 13.1.(	Skiløype - Trasé ABE -	Prisendring frem til byggestart	2 965 420,10	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12'	0,03	88 963	24 667,72	3,6								
	Beskrivelse	Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												
 13.2.(	Skiløype - Trasé ABE -	Prisendring i byggeperioden	2 915 996,43	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0	0,03	87 480	24 667,72	3,5								
	Beskrivelse	Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %												
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ABE - Nedre trasé						176 442	24 667,72	7,2							
 13		Prisregulering Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé				2 elementer			16 681,52								
 13.1.(	Skiløype - Trasé ECD -	Prisendring frem til byggestart	104 417,74	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12'	0,03	3 133	16 681,52	0,2								
	Beskrivelse	Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av prosjektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.		Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %												

PROSJEKT : 230275 - Gjevillvassdalen skiløyper - med mye snø										Nordplan AS	
KONTO : 13 Prisregulering				ELEMENTER : 10		PRIS : 446 817		UMA : 104 896,77		PRIS/UMA : 4,3	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enh	Info	Pris/Enh	Pris	UMA	ris/UMA		
13.2.i	Skiløype - Trasé ECD - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	102 677,44	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0	0,03	3 080	16 681,52	0,2		
				Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %						
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé ECD - Nedre trasé					6 213	16 681,52	0,4		
13		Prisregulering Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen			2 elementer				11 024,93		
13.1.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Prisendring frem til byggestart Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	229 210,97	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12'	0,03	6 876	11 024,93	0,6		
				Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %						
13.2.i	Skiløype - Trasé EFG - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	225 390,79	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0	0,03	6 762	11 024,93	0,6		
				Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %						
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé EFG - Mot Osen					13 638	11 024,93	1,2		
13		Prisregulering Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen			2 elementer				15 190,29		
13.1.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Prisendring frem til byggestart Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele beløpet Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	82 051,90	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggestart/12'	0,03	2 462	15 190,29	0,2		
				Mrk	Komplette avsetninger for prisendring basert på %						
13.2.i	Skiløype - Trasé EFH - Beskrivelse	Prisendring i byggeperioden Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59) Prosentvis andel av projektkostnad Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59 Prosentatsen reguleres i reseptmengden. K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.	80 684,37	kr	(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*Byggetid/12*0	0,03	2 421	15 190,29	0,2		
				Mrk	Komplette avsetninger for prisstigning basert på %						
	SUM 13	Prisregulering Skiløype - Trasé EFH - Mot Osen					4 882	15 190,29	0,3		
	SUM 13	Prisregulering					446 817	104 896,77	4,3		
